

# 上野原市指定文化財保福寺鐘樓

## 修復事業經過報告書

平成 30 年 11 月

安寧山保福寺

中村建築文化研究所

# 安寧山保福寺鐘樓修復事業経過報告書

## 1. 工事概要

### 仮設工事

素屋根組立・差し掛け作業小屋及び休憩所の建設及び解体。

### 本体工事

#### 解体工事

屋根の全面解体、小屋組の母屋・野隅木の解体、軒廻り及び箱棟の全面解体。

袴腰と地覆(地覆石)及び階段の全面解体。

上層縁板及び天井板の全面解体。

#### 組立工事

地覆石の据え直しと地覆の取替え及び軸部の補強と不陸調整。

袴腰鎧下見板全面張り替え及び下地の取り替え。

階段の組立と床板張り替え及び簀の子板敷き込み。

上層縁板の繕い組立及び天井板の張り替え。

軒廻り(化粧垂木・化粧裏板・木負・茅負・裏甲・軒付)の繕い及び取替材等の組立。

小屋組(桔木・母屋・隅木・束)の繕い及び取替材・補強材の組立。

屋根下地(野垂木・野地板)の取替材の組立。

螻羽の破風板・木連格子の繕い組立及び箱棟の取替材組立。

#### 屋根板金工事

上層縁板上部の全面銅板葺き替え。

屋根の全面銅板葺き替え。

箱棟及び鬼板の全面銅板葺き替え。

## 2. 事業期間

事業計画・実施設計 平成28年1月 ～ 平成28年12月

見積入札・施工者決定 平成29年1月 ～ 平成29年3月

修復工事実施 平成29年8月 ～ 平成30年8月

## 3. 施工者

仮設工事	株式会社三和リース	山梨県笛吹市御坂町成田 2436
本体工事	株式会社奥谷組	京都府京都市南区吉祥院向田東町 8
屋根板金工事	久保板金工業株式会社	東京都足立区千住中居町 25-8



着工前 2017.3.1



着工前 2017.3.1



素屋根組立 2017.8.11



素屋根組立完了 2017.8.19



屋根鉄板解体 2017.8.21



屋根鉄板解体完了 2017.8.22



縁板覆い鉄板解体完了 2017.8.23



袴腰鉄板解体 2017.8.24



野地板解体 2017.8.26



野垂木解体 2017.9.30



袴腰解体 2017.10.12



袴腰下地解体 2017.10.14



化粧裏板解体 2017.10.14



小屋内盤木腐れ部剥木 2017.10.30



1階台輪下盤木腐れ除去 2017.11.3



軸部建て起こし 2017.11.14



茅負剥木繕い 2017.11.27



裏甲剥木繕い 2017.11.29



梁の補強 2017.12.19



隅木の補強 2017.12.26



木負（取替材）取付 2017.1.19



茅負取付 2018.1.20



軸部筋違い（取替材）取付 2018.1.22



ヒエン垂木・化粧裏板取付 2018.2.9



裏甲組立 2018.2.28



小屋束の補強 2018.3.8



野隅木補強 2018.3.12



桔木補強 2018.3.19



母屋組立 2018.3.22




軒付組立 2018.3.26



袴腰地覆基礎補修 2018.4.5



袴腰地覆基礎補修完了 2018.4.11

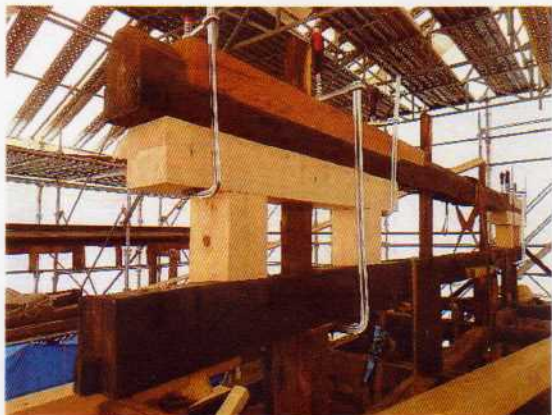

棟木補強組立 2018.5.16



木連格子組立 2018.5.21



野垂木組立 2018.5.23



野地板張り 2018.6.8



銅板葺き 2018.6.25



箱棟組立 2018.6.28



袴腰地覆組立 2018.7.2



袴腰下見板下地組立 2018.7.12



天井板組立 2018.7.13



縁板組立 2018.7.17



縁板銅板葺き 2018.7.24



袴腰下見板張り 2018.7.27



袴腰鎧棧組立 2018.8.3



屋根完成 2018.8.6



階段組立 2018.8.6



素屋根解体 2018.8.10





素屋根解体完了 2018.8.18



階段完成 2018.8.20



完成 2018.8.20



完成 2018.8.20



完成 2018.8.20



完成 2018.8.20
